Plan de visitas para el diagnóstico de farmacias y almacenes de Honduras

52 revisiones con 8 equipos de 3 personas desde el lunes 9 de noviembre de 2026

El programa organiza la revisión farmacéutica, operativa y regulatoria de 32 farmacias hospitalarias, con su almacén interno, y 20 ALM. Cada instalación se revisa una sola vez y se reserva una unidad por equipo al día. Los CEDIS son puntos de salida y retorno; Santa Rosa de Copán sirve para descansar y continuar el corredor de occidente. Estos tres apoyos no se cuentan como revisiones.

Recurso o resultado	Programa con 8 equipos
Unidades por revisar	52: 32 farmacias hospitalarias y 20 ALM
Equipos y personas de campo	8 equipos de 3 personas: 24 en total
Vehículos utilitarios terrestres	8: uno por equipo
Inicio del trabajo	Lunes 9 de noviembre de 2026
Última revisión prevista	23 nov 2026
Retorno del último equipo	25 nov 2026
Cierre de informes y auditoría	30 de noviembre y 1 de diciembre de 2026
Duración programada	17 días de lunes a viernes
Recorrido terrestre acumulado	4,309 km
Tiempo de carretera acumulado	83 h 19 min

Kilómetros y horas: suma de los recorridos terrestres de todos los equipos durante el estudio completo. Excluyen vuelos, navegación y movimientos locales sin medición vial. Las fechas son de planeación y dependen de citas, accesos y conexiones.

Conformación de los equipos y alcance de la revisión

Integrante	Por equipo	Total	Función
Operador	1	8	Conducción del utilitario, traslados y apoyo logístico de la jornada.
Especialista disponible	1	8	Una persona de farmacia, operación y almacenes, o regulación y calidad, según disponibilidad. Realiza el levantamiento con el acompañamiento de SESAL.
Personal de SESAL	1	8	Acompañamiento de la revisión y coordinación con los responsables de la instalación, conforme a sus funciones.
TOTAL DE CAMPO	3	24	La conformación es la misma para los ocho equipos.

Se asigna un solo especialista por equipo, en cualquiera de los rubros indicados, según exista disponibilidad. El especialista y el personal de SESAL realizan el levantamiento de farmacia, operación y regulación conforme a la función de la instalación. Los puntos que requieran revisión de otra especialidad se identifican para su validación durante el cierre y la auditoría.

La coordinación de citas, cambios de agenda y recepción de fichas se mantiene como una función compartida. No se añade otra persona a las 24 de campo. No se incluyen consultorios, camas ni evaluación de la administración hospitalaria.

Punto de apoyo	Uso durante el estudio
C1 Tegucigalpa	Cuatro equipos A1 a A4. Salida inicial y retorno.
C2 San Pedro Sula	Cuatro equipos B1 a B4. Salida inicial y retorno.
R1 Santa Rosa de Copán	Descanso y continuación de la ruta de occidente después de pernoctar. No funciona como base inicial.

Los ocho utilitarios cubren los corredores terrestres. El transporte local de Roatán y Puerto Lempira se confirma por separado; no se presupone que el utilitario continental viaje con el equipo.

Jornada de revisión y movilidad

Horario	Actividad
08:00 a 08:30	Apertura con el responsable de farmacia o almacén y confirmación de documentos.
08:30 a 10:30	Entrevistas y revisión de registros con el especialista disponible y el acompañamiento de SESAL.
10:30 a 12:30	Recorrido, mediciones, inventario por muestra y observación de procesos.
12:30 a 13:15	Pausa de alimentación.
13:15 a 14:45	Conciliación de CPM, claves, existencias, tiempos y documentación pendiente.
14:45 a 16:00	Revisión de hallazgos, prioridades y cierre de la ficha de la unidad.
16:00 a 17:00	Extensión excepcional; se revisa la movilidad posterior antes de continuar.

Se programa regreso al CEDIS cuando cada tramo de carretera previsto cabe en dos horas y la conducción del día de revisión no supera cuatro horas. Puede avanzarse hacia la unidad siguiente hasta tres horas después de la revisión, dentro de ese mismo límite diario. Cuando el recorrido no cabe, se reserva una jornada exclusiva de traslado y se pernocta cerca de la siguiente unidad.

No se programan revisiones ni traslados de trabajo en sábado o domingo. Los días de traslado salen a las 08:00 y contemplan pausas de conducción. Los accesos locales y los desplazamientos entre hospedaje e instalación quedan por confirmar cuando no hay una medición vial disponible.

Las zonas de descanso se definen por cercanía a la siguiente unidad, servicios disponibles y seguridad. No hay hoteles reservados. Las llegadas posteriores a las 16:00 corresponden a movilidad después de la revisión; una extensión de la revisión obliga a ajustar ese traslado.

Consideraciones para Roatán y Puerto Lempira

Cada zona comprende dos revisiones: una farmacia hospitalaria y un ALM. Se reserva un día de conexión de ida y otro de regreso, además de las dos jornadas de revisión. Los horarios y la duración del transporte permanecen por confirmar; la programación no acredita una reserva.

Zona	Equipo	Secuencia prevista en noviembre de 2026	Confirmación previa
Roatán	B4	12 nov: conexión de ida. 13 nov: Hospital de Roatán. 16 nov: ALM Región Islas de la Bahía. 17 nov: conexión de regreso.	Conexión aérea o marítima desde el corredor de La Ceiba, según disponibilidad. Confirmar terminal, horarios, transporte local y hospedaje.
Puerto Lempira	B1	18 nov: posicionamiento en La Ceiba. 19 nov: conexión de ida. 20 nov: Hospital Puerto Lempira. 23 nov: ALM Región Gracias a Dios. 24 nov: conexión de regreso.	Confirmar la conexión disponible y sus condiciones antes de reservar. No se presupone acceso terrestre continuo desde La Ceiba. Prever transporte local y hospedaje.

B1 conserva Yoro, Olanchito y Colón antes de conectar a Puerto Lempira desde La Ceiba. B4 sigue el corredor de Tela y La Ceiba y después realiza Roatán. Se evita asignar estas conexiones al equipo de occidente.

Por equipo viajan tres personas: operador, especialista disponible y personal de SESAL. Antes de salir se confirman plazas, equipaje de trabajo, documentos requeridos, punto de llegada, vehículo local y acceso a las unidades. El utilitario continental y su resguardo se coordinan sin asumir que cruzará con el equipo.

El fin de semana del 14 y 15 de noviembre queda entre las dos revisiones de Roatán; el del 21 y 22, entre las dos de Puerto Lempira. No se programa trabajo esos días. Cambios del transportista pueden requerir reordenar el bloque y utilizar la reserva; si no alcanza, debe actualizarse el cierre general.

Mapa general de los ocho equipos

Colores por equipo. Círculos: farmacias hospitalarias; cuadrados: ALM. C1 y C2: bases; R1: descanso. Los tramos compartidos pueden superponerse. Las conexiones a Roatán y Puerto Lempira no se dibujan como carreteras.



Asignación de unidades y cronograma general

Equipo	Corredor	Farmacias	ALM	Total	Última revisión	Retorno de campo
A1	Distrito Central y Amarateca	7	2	9	19/11	19/11
A2	Choluteca, Valle y El Paraíso	3	3	6	17/11	17/11
A3	Comayagua, La Paz e Intibucá	3	3	6	16/11	17/11
A4	Olancho: Juticalpa y Catacamas	2	1	3	12/11	13/11
B1	Yoro, Olanchito, Colón y Puerto Lempira	5	3	8	23/11	25/11
B2	Copán, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara	4	4	8	20/11	23/11
B3	San Pedro Sula, Puerto Cortés y El Progreso	5	2	7	17/11	17/11
B4	Tela, La Ceiba y Roatán	3	2	5	16/11	18/11
TOTAL	Cuatro equipos por CEDIS	32	20	52	23/11	25/11

Etapa	Fecha prevista de 2026	Trabajo programado
Revisiones y cambios de zona	9 al 23 de noviembre	Una unidad por equipo y por día; traslados y conexiones separados de las revisiones.
Retorno del último equipo	25 de noviembre	B1 completa el regreso a San Pedro Sula después de Puerto Lempira.
Reserva del último equipo	26 y 27 de noviembre	Dos jornadas previstas para reprogramaciones. Los demás equipos mantienen su propia reserva después del recorrido.
Cierre de informes y auditoría	30 de noviembre y 1 de diciembre	Dos jornadas comunes de 08:00 a 16:00 para los ocho equipos.

Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre son exclusivamente para cierre de informes y auditoría, no nuevas visitas. El 28 y 29 de noviembre son fin de semana. Los equipos que terminan antes tienen disponibilidad para revisión documental y coordinación; no se les agregan unidades duplicadas.

Cronograma del equipo A1

CEDIS Tegucigalpa Distrito Central y Amarateca Parte 1 de 1

Fecha 2026	Actividad y unidad	Origen y salida	Destino al terminar	Carretera del día
09/11	Revisión 1 Hospital Escuela 08:00 a 16:00	CEDIS Tegucigalpa Salida 07:51	Tegucigalpa Llegada 16:09	8.7 km 0 h 19 min
10/11	Revisión 2 Instituto Nacional del Tórax 08:00 a 16:00	CEDIS Tegucigalpa Salida 07:46	Tegucigalpa Llegada 16:15	21.2 km 0 h 30 min
11/11	Revisión 3 Hospital San Felipe 08:00 a 16:00	CEDIS Tegucigalpa Salida 07:45	Tegucigalpa Llegada 16:17	22.4 km 0 h 32 min
12/11	Revisión 4 Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza 08:00 a 16:00	CEDIS Tegucigalpa Salida 07:51	Tegucigalpa Llegada 16:10	9.0 km 0 h 18 min
13/11	Revisión 5 Hospital María Especialidades Pediátricas 08:00 a 16:00	CEDIS Tegucigalpa Salida 07:50	Tegucigalpa Llegada 16:10	11.7 km 0 h 20 min
16/11	Revisión 6 Hospital Centro Hondureño para el Niño Quemado 08:00 a 16:00	CEDIS Tegucigalpa Salida 07:50	Tegucigalpa Llegada 16:11	11.9 km 0 h 21 min
17/11	Revisión 7 Hospital Santa Rosita 08:00 a 16:00	CEDIS Tegucigalpa Salida 07:28	Tegucigalpa Llegada 16:38	67.4 km 1 h 10 min
18/11	Revisión 8 ALM REGION METROPOLITANA DEL DISTRITO CENTRAL 08:00 a 16:00	CEDIS Tegucigalpa Salida 08:00	Tegucigalpa Llegada 16:00	0.0 km 0 h 00 min
19/11	Revisión 9 ALM REGION FRANCISCO MORAZAN 08:00 a 16:00	CEDIS Tegucigalpa Salida 07:49	Tegucigalpa Llegada 16:11	10.1 km 0 h 22 min


Reserva de este equipo: 20/11, 23/11 de noviembre. Cierre de informes y auditoría: 30/11 y 01/12, de 08:00 a 16:00. Las horas de salida y llegada son aproximadas; el acceso local no medido y las conexiones se confirman antes de viajar.

Mapa del equipo A1

CEDIS Tegucigalpa Distrito Central y Amarateca

Revisiones	Farmacias	ALM	Recorrido terrestre	Carretera acumulada
9	7	2	162 km	3 h 52 min

Números = orden de revisión en el cronograma. Blanco = ALM aproximado; color = farmacia hospitalaria. C1 y C2 son bases, y R1 es descanso. Las líneas discontinuas son referencias viales recompuestas con tramos guardados; no se trazan conexiones aéreas o marítimas como carretera.

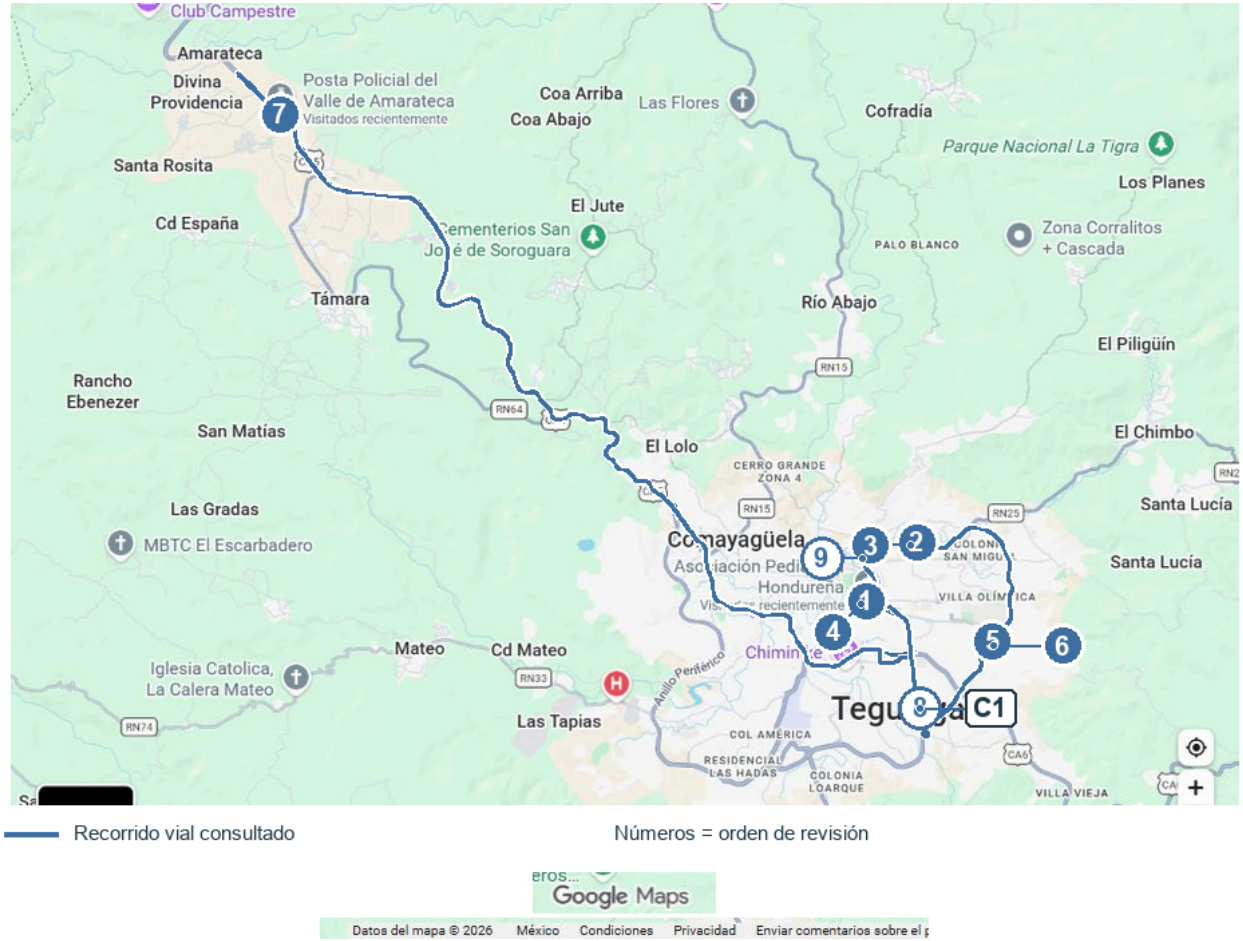

Cronograma del equipo A2

CEDIS Tegucigalpa Choluteca, Valle y El Paraíso Parte 1 de 1

Fecha 2026	Actividad y unidad	Origen y salida	Destino al terminar	Carretera del día
09/11	Traslado Cambio de zona para iniciar la revisión a las 08:00	CEDIS Tegucigalpa Salida 08:00	Choluteca Llegada 11:24	151.2 km 2 h 53 min
10/11	Revisión 1 Hospital del Sur 08:00 a 16:00	Zona de Choluteca Salida por confirmar	Choluteca Llegada 16:01	0.3 km 0 h 01 min
11/11	Revisión 2 ALM REGION CHOLUTECA 08:00 a 16:00	Zona de Choluteca Salida por confirmar	San Lorenzo Llegada 16:48	35.4 km 0 h 47 min
12/11	Revisión 3 Hospital San Lorenzo 08:00 a 16:00	Zona de San Lorenzo Salida por confirmar	San Lorenzo Llegada por confirmar	0.0 km 0 h 00 min
13/11	Revisión 4 ALM REGION VALLE 08:00 a 16:00	Zona de San Lorenzo Salida 07:36	Tegucigalpa Llegada 17:58	121.7 km 2 h 22 min
16/11	Revisión 5 Hospital Gabriela Alvarado 08:00 a 16:00	CEDIS Tegucigalpa Salida 06:10	Tegucigalpa Llegada 17:52	196.7 km 3 h 42 min
17/11	Revisión 6 ALM REGION EL PARAISO 08:00 a 16:00	CEDIS Tegucigalpa Salida 06:14	Tegucigalpa Llegada 17:46	189.9 km 3 h 31 min


Reserva de este equipo: 18/11, 19/11 de noviembre. Cierre de informes y auditoría: 30/11 y 01/12, de 08:00 a 16:00. Las horas de salida y llegada son aproximadas; el acceso local no medido y las conexiones se confirman antes de viajar.

Mapa del equipo A2

CEDIS Tegucigalpa Choluteca, Valle y El Paraíso

Revisiones	Farmacias	ALM	Recorrido terrestre	Carretera acumulada
6	3	3	695 km	13 h 17 min

Números = orden de revisión en el cronograma. Blanco = ALM aproximado; color = farmacia hospitalaria. C1 y C2 son bases, y R1 es descanso. Las líneas discontinuas son referencias viales recompuestas con tramos guardados; no se trazan conexiones aéreas o marítimas como carretera.

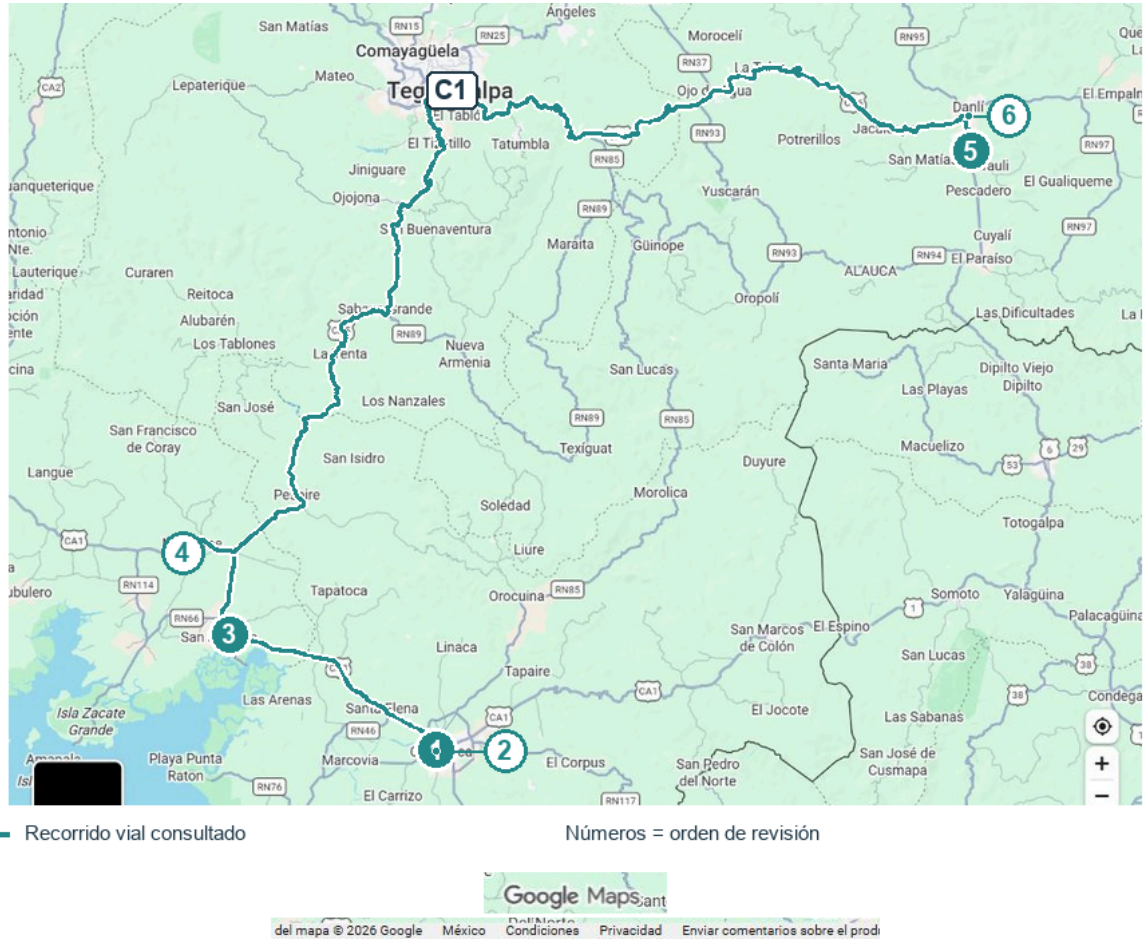

Cronograma del equipo A3

CEDIS Tegucigalpa Comayagua, La Paz e Intibucá Parte 1 de 1

Fecha 2026	Actividad y unidad	Origen y salida	Destino al terminar	Carretera del día
09/11	Revisión 1 Hospital Santa Teresa 08:00 a 16:00	CEDIS Tegucigalpa Salida 06:35	Tegucigalpa Llegada 17:29	182.4 km 2 h 54 min
10/11	Revisión 2 ALM REGION COMAYAGUA 08:00 a 16:00	CEDIS Tegucigalpa Salida 06:32	Tegucigalpa Llegada 17:32	184.4 km 3 h 00 min
11/11	Revisión 3 Hospital Dr. Roberto Suazo Córdova 08:00 a 16:00	CEDIS Tegucigalpa Salida 06:36	Tegucigalpa Llegada 17:25	176.0 km 2 h 49 min
12/11	Revisión 4 ALM REGION LA PAZ 08:00 a 16:00	CEDIS Tegucigalpa Salida 06:37	Intibucá Llegada 17:51	181.9 km 3 h 14 min
13/11	Revisión 5 Hospital Dr. Enrique Aguilar 08:00 a 16:00	Zona de Intibucá Salida por confirmar	La Esperanza Llegada 16:08	2.5 km 0 h 07 min
16/11	Revisión 6 ALM REGION INTIBUCA 08:00 a 16:00	Zona de La Esperanza Salida por confirmar	La Esperanza Llegada por confirmar	0.0 km 0 h 00 min
17/11	Traslado Regreso al CEDIS de origen	Zona de La Esperanza Salida 08:00	Tegucigalpa Llegada 11:35	191.9 km 3 h 04 min


Reserva de este equipo: 18/11, 19/11 de noviembre. Cierre de informes y auditoría: 30/11 y 01/12, de 08:00 a 16:00. Las horas de salida y llegada son aproximadas; el acceso local no medido y las conexiones se confirman antes de viajar.

Mapa del equipo A3

CEDIS Tegucigalpa Comayagua, La Paz e Intibucá

Revisiones	Farmacias	ALM	Recorrido terrestre	Carretera acumulada
6	3	3	919 km	15 h 08 min

Números = orden de revisión en el cronograma. Blanco = ALM aproximado; color = farmacia hospitalaria. C1 y C2 son bases, y R1 es descanso. Las líneas discontinuas son referencias viales recompuestas con tramos guardados; no se trazan conexiones aéreas o marítimas como carretera.

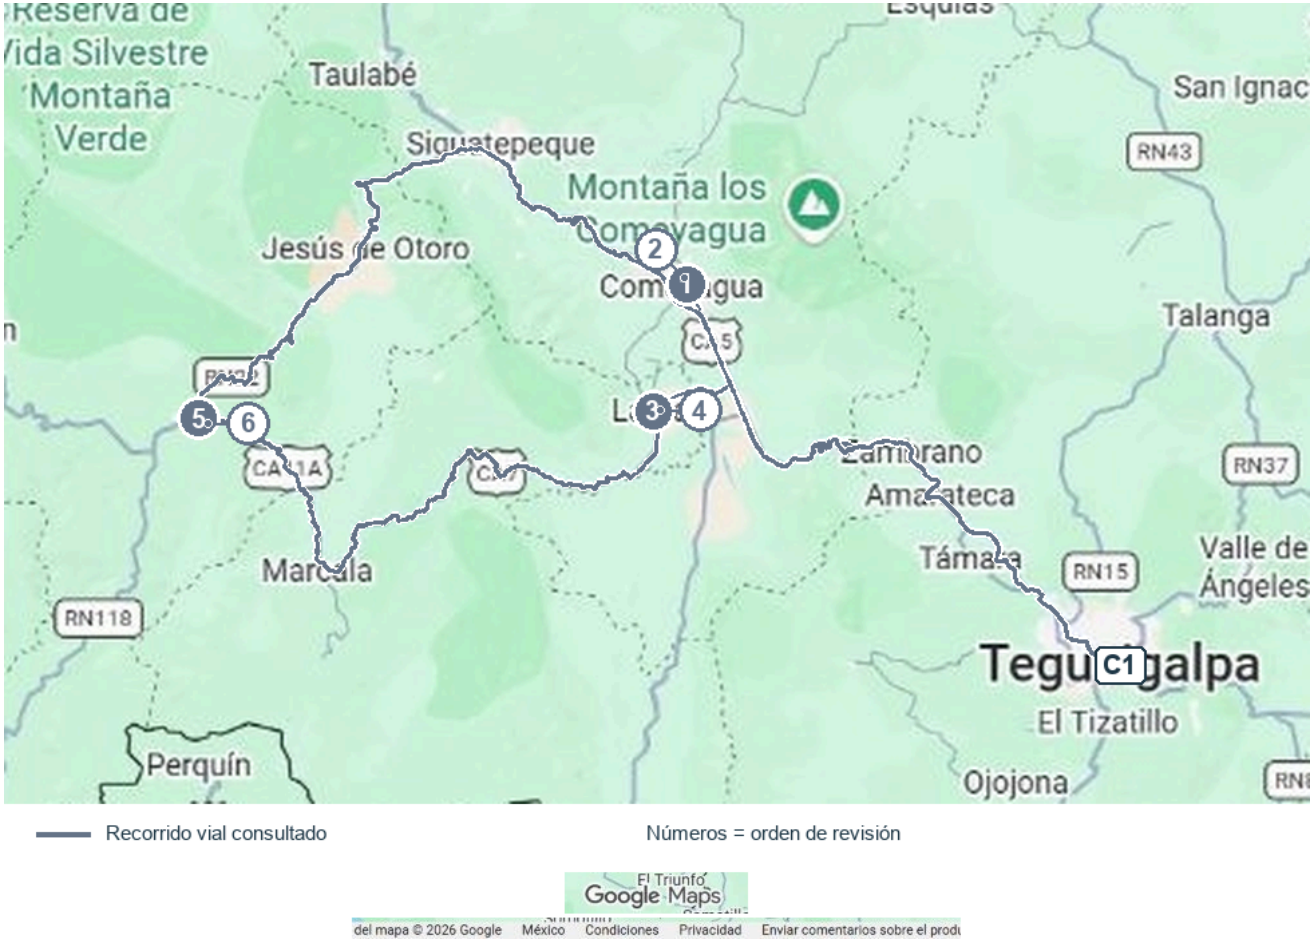

Cronograma del equipo A4

CEDIS Tegucigalpa Olancho: Juticalpa y Catacamas Parte 1 de 1

Fecha 2026	Actividad y unidad	Origen y salida	Destino al terminar	Carretera del día
09/11	Traslado Cambio de zona para iniciar la revisión a las 08:00	CEDIS Tegucigalpa Salida 08:00	Juticalpa Llegada 11:38	181.7 km 3 h 07 min
10/11	Revisión 1 Hospital San Francisco 08:00 a 16:00	Zona de Juticalpa Salida por confirmar	Juticalpa Llegada 16:04	0.9 km 0 h 03 min
11/11	Revisión 2 ALM REGION OLANCHO 08:00 a 16:00	Zona de Juticalpa Salida por confirmar	Catacamas Llegada 16:54	42.8 km 0 h 53 min
12/11	Revisión 3 Santo Hermano Pedro Betancourt 08:00 a 16:00	Zona de Catacamas Salida por confirmar	Catacamas Llegada por confirmar	0.0 km 0 h 00 min
13/11	Traslado Regreso al CEDIS de origen	Zona de Catacamas Salida 08:00	Tegucigalpa Llegada 12:18	217.6 km 3 h 47 min


Reserva de este equipo: 16/11, 17/11 de noviembre. Cierre de informes y auditoría: 30/11 y 01/12, de 08:00 a 16:00. Las horas de salida y llegada son aproximadas; el acceso local no medido y las conexiones se confirman antes de viajar.

Mapa del equipo A4

CEDIS Tegucigalpa Olancho: Juticalpa y Catacamas

Revisiones	Farmacias	ALM	Recorrido terrestre	Carretera acumulada
3	2	1	443 km	7 h 51 min

Números = orden de revisión en el cronograma. Blanco = ALM aproximado; color = farmacia hospitalaria. C1 y C2 son bases, y R1 es descanso. Las líneas discontinuas son referencias viales recompuestas con tramos guardados; no se trazan conexiones aéreas o marítimas como carretera.

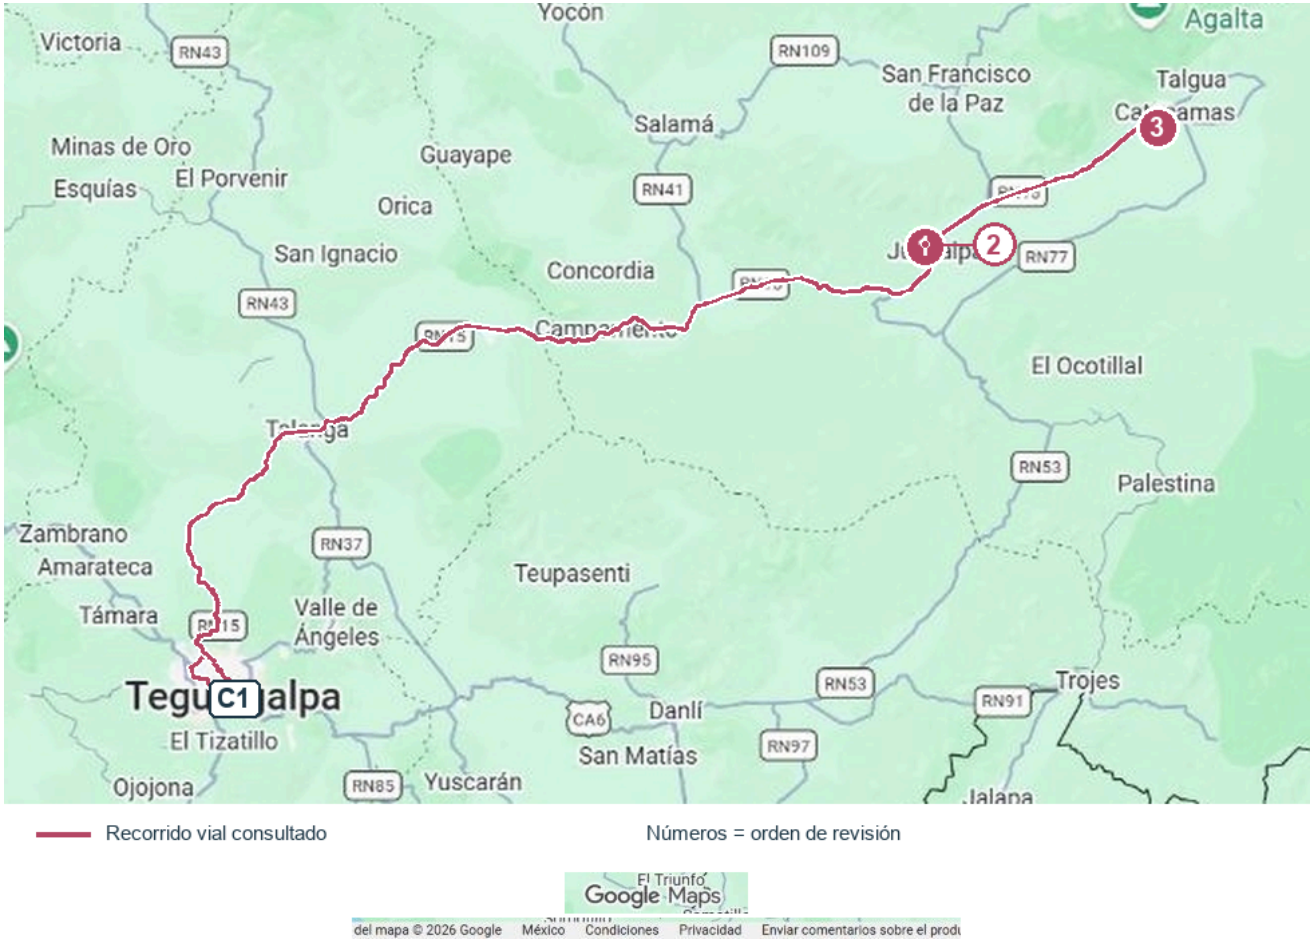

Cronograma del equipo B1

CEDIS San Pedro Sula Yoro, Olanchito, Colón y Puerto Lempira Parte 1 de 2

Fecha 2026	Actividad y unidad	Origen y salida	Destino al terminar	Carretera del día
09/11	Traslado Cambio de zona para iniciar la revisión a las 08:00	CEDIS San Pedro Sula Salida 08:00	Yoro Llegada 11:17	172.5 km 2 h 47 min
10/11	Revisión 1 ALM REGION YORO 08:00 a 16:00	Zona de Yoro Salida por confirmar	Yoro Llegada 16:01	0.3 km 0 h 01 min
11/11	Revisión 2 Hospital Manuel J. Subirana 08:00 a 16:00	Zona de Yoro Salida por confirmar	Olanchito Llegada 18:05	109.9 km 2 h 05 min
12/11	Revisión 3 Hospital Aníbal Murillo 08:00 a 16:00	Zona de Olanchito Salida por confirmar	Tocoa Llegada 17:39	72.4 km 1 h 39 min
13/11	Revisión 4 Hospital San Isidro 08:00 a 16:00	Zona de Tocoa Salida por confirmar	Trujillo Llegada 17:15	58.7 km 1 h 14 min
16/11	Revisión 5 Hospital Salvador Paredes 08:00 a 16:00	Zona de Trujillo Salida por confirmar	Trujillo Llegada 16:10	5.5 km 0 h 10 min
17/11	Revisión 6 ALM REGION COLON 08:00 a 16:00	Zona de Trujillo Salida por confirmar	Trujillo Llegada por confirmar	0.0 km 0 h 00 min

Cronograma del equipo B1

CEDIS San Pedro Sula Yoro, Olanchito, Colón y Puerto Lempira Parte 2 de 2

Fecha 2026	Actividad y unidad	Origen y salida	Destino al terminar	Carretera del día
18/11	Traslado Posicionamiento en La Ceiba para la conexión	Zona de Trujillo Salida 08:00	La Ceiba Llegada 11:45	146.0 km 3 h 15 min
19/11	Conexión La Ceiba a Puerto Lempira	Terminal y salida por confirmar	Puerto Lempira Llegada por confirmar	Sin medición terrestre
20/11	Revisión 7 Hospital Puerto Lempira 08:00 a 16:00	Hospedaje en Puerto Lempira Salida por confirmar	Puerto Lempira Llegada por confirmar	0.0 km 0 h 00 min
23/11	Revisión 8 ALM REGION GRACIAS A DIOS 08:00 a 16:00	Hospedaje en Puerto Lempira Salida por confirmar	Puerto Lempira Llegada por confirmar	0.0 km 0 h 00 min
24/11	Conexión Puerto Lempira a La Ceiba	Terminal y salida por confirmar	La Ceiba Llegada por confirmar	Sin medición terrestre
25/11	Traslado Regreso al CEDIS de origen	Zona de La Ceiba Salida 08:00	San Pedro Sula Llegada 12:01	190.2 km 3 h 31 min


Reserva de este equipo: 26/11, 27/11 de noviembre. Cierre de informes y auditoría: 30/11 y 01/12, de 08:00 a 16:00. Las horas de salida y llegada son aproximadas; el acceso local no medido y las conexiones se confirman antes de viajar.

Mapa del equipo B1

CEDIS San Pedro Sula Yoro, Olanchito, Colón y Puerto Lempira

Revisiones	Farmacias	ALM	Recorrido terrestre	Carretera acumulada
8	5	3	756 km	14 h 41 min

Números = orden de revisión en el cronograma. Blanco = ALM aproximado; color = farmacia hospitalaria. C1 y C2 son bases, y R1 es descanso. Las líneas discontinuas son referencias viales recompuestas con tramos guardados; no se trazan conexiones aéreas o marítimas como carretera.

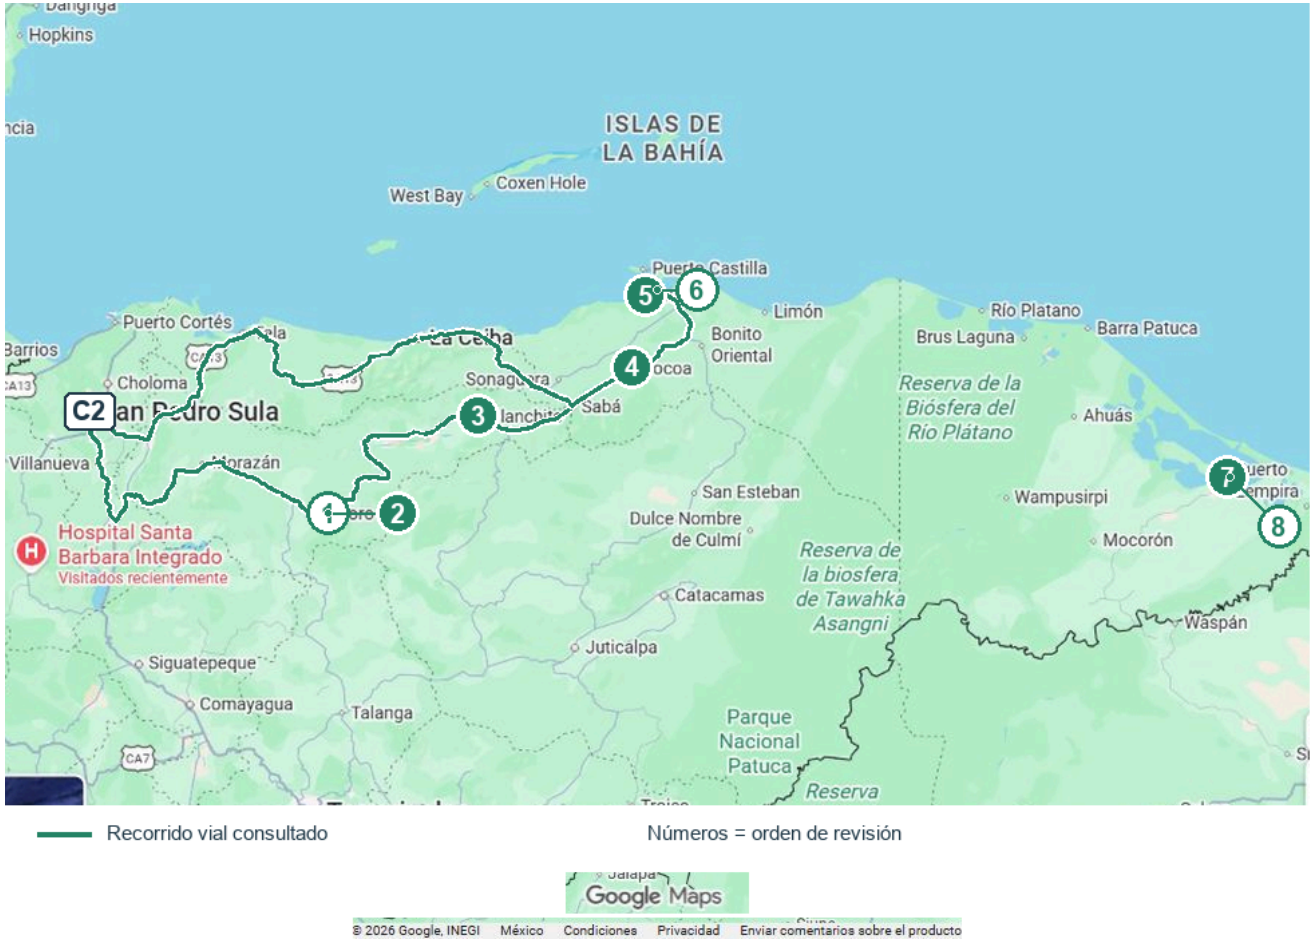

Cronograma del equipo B2

CEDIS San Pedro Sula Copán, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara Parte 1 de 2

Fecha 2026	Actividad y unidad	Origen y salida	Destino al terminar	Carretera del día
09/11	Traslado Traslado a Santa Rosa de Copán para descanso y continuación	CEDIS San Pedro Sula Salida 08:00	Santa Rosa de Copán Llegada 11:40	157.1 km 3 h 10 min
10/11	Revisión 1 Hospital de Occidente 08:00 a 16:00	Relanzamiento Santa Rosa de Copán Salida 07:54	Santa Rosa de Copán Llegada 16:07	3.9 km 0 h 13 min
11/11	Revisión 2 ALM REGION COPAN 08:00 a 16:00	Zona de Santa Rosa de Copán Salida por confirmar	Gracias Llegada 17:09	47.0 km 1 h 09 min
12/11	Revisión 3 Hospital Juan Manuel Gálvez 08:00 a 16:00	Zona de Gracias Salida por confirmar	Gracias Llegada 16:06	1.2 km 0 h 06 min
13/11	Revisión 4 ALM REGION LEMPIRA 08:00 a 16:00	Zona de Gracias Salida por confirmar	San Marcos Llegada 18:39	112.0 km 2 h 39 min
16/11	Revisión 5 Hospital de San Marcos 08:00 a 16:00	Zona de San Marcos Salida por confirmar	Ocotepeque Llegada 17:23	49.7 km 1 h 23 min

Cronograma del equipo B2

CEDIS San Pedro Sula Copán, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara Parte 2 de 2

Fecha 2026	Actividad y unidad	Origen y salida	Destino al terminar	Carretera del día
17/11	Revisión 6 ALM REGION OCOTEPEQUE 08:00 a 16:00	Zona de Ocotepeque Salida por confirmar	Ocotepeque Llegada por confirmar	0.0 km 0 h 00 min
18/11	Traslado Cambio de zona para iniciar la revisión a las 08:00	Zona de Ocotepeque Salida 08:00	Santa Bárbara Llegada 14:18	268.1 km 5 h 17 min
19/11	Revisión 7 Hospital Santa Bárbara 08:00 a 16:00	Zona de Santa Bárbara Salida por confirmar	Santa Bárbara Llegada 16:01	0.1 km 0 h 01 min
20/11	Revisión 8 ALM REGION SANTA BARBARA 08:00 a 16:00	Zona de Santa Bárbara Salida por confirmar	Santa Bárbara Llegada por confirmar	0.0 km 0 h 00 min
23/11	Traslado Regreso al CEDIS de origen	Zona de Santa Bárbara Salida 08:00	San Pedro Sula Llegada 10:34	101.8 km 2 h 04 min


Reserva de este equipo: 24/11, 25/11 de noviembre. Cierre de informes y auditoría: 30/11 y 01/12, de 08:00 a 16:00. Las horas de salida y llegada son aproximadas; el acceso local no medido y las conexiones se confirman antes de viajar.

Mapa del equipo B2

CEDIS San Pedro Sula Copán, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara

Revisiones	Farmacias	ALM	Recorrido terrestre	Carretera acumulada
8	4	4	741 km	16 h 01 min

Números = orden de revisión en el cronograma. Blanco = ALM aproximado; color = farmacia hospitalaria. C1 y C2 son bases, y R1 es descanso. Las líneas discontinuas son referencias viales recompuestas con tramos guardados; no se trazan conexiones aéreas o marítimas como carretera.

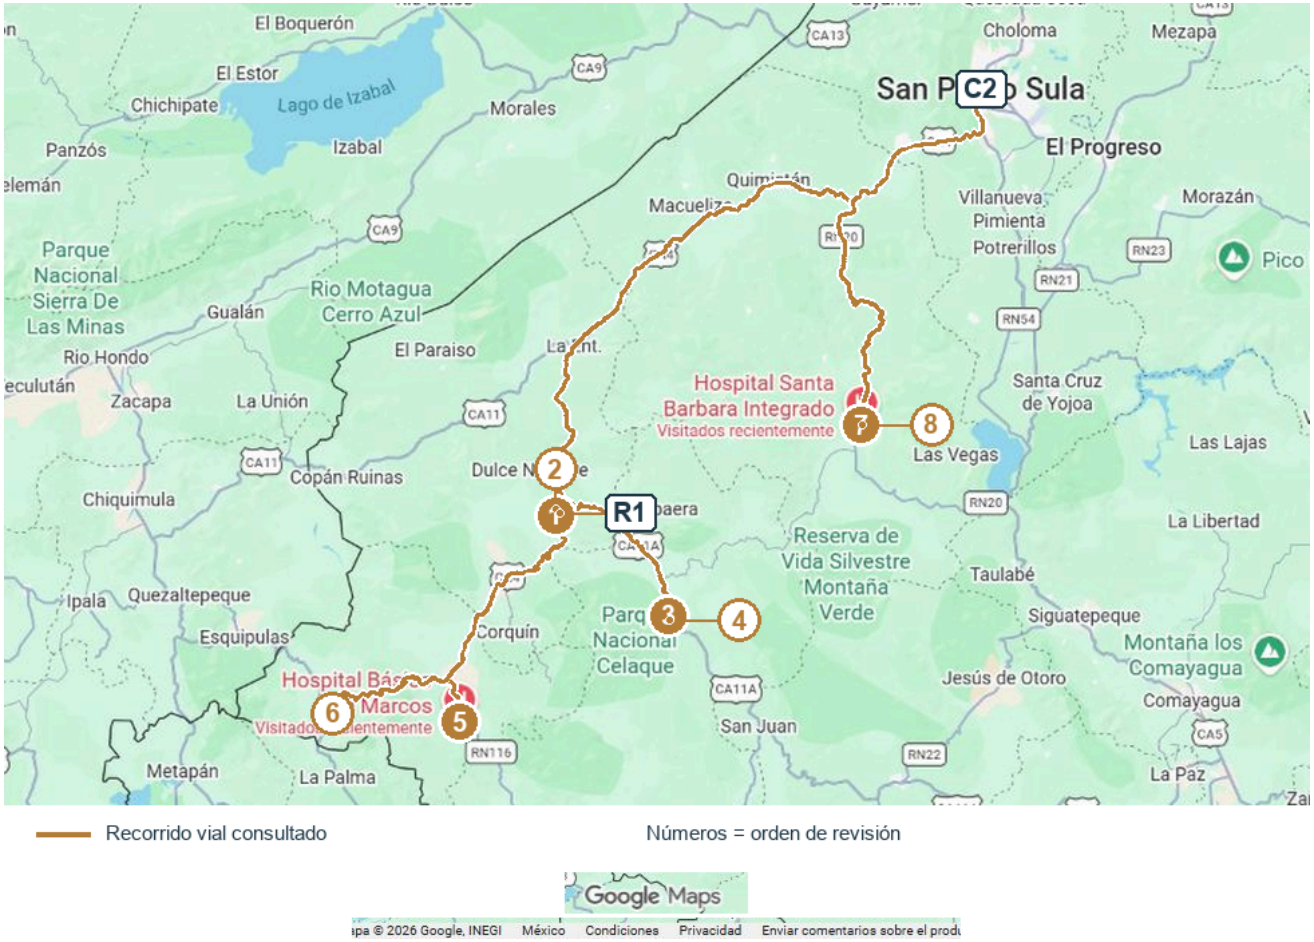

Cronograma del equipo B3

CEDIS San Pedro Sula San Pedro Sula, Puerto Cortés y El Progreso Parte 1 de 1

Fecha 2026	Actividad y unidad	Origen y salida	Destino al terminar	Carretera del día
09/11	Revisión 1 Hospital Leonardo Martínez 08:00 a 16:00	CEDIS San Pedro Sula Salida 07:55	San Pedro Sula Llegada 16:06	2.9 km 0 h 11 min
10/11	Revisión 2 Hospital Mario Catarino Rivas 08:00 a 16:00	CEDIS San Pedro Sula Salida 07:52	San Pedro Sula Llegada 16:12	8.1 km 0 h 20 min
11/11	Revisión 3 Hospital San Juan de Dios 08:00 a 16:00	CEDIS San Pedro Sula Salida 07:45	San Pedro Sula Llegada 16:19	11.5 km 0 h 34 min
12/11	Revisión 4 ALM REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA 08:00 a 16:00	CEDIS San Pedro Sula Salida 07:54	San Pedro Sula Llegada 16:08	3.9 km 0 h 14 min
13/11	Revisión 5 ALM REGION CORTES 08:00 a 16:00	CEDIS San Pedro Sula Salida 07:52	San Pedro Sula Llegada 16:13	7.9 km 0 h 21 min
16/11	Revisión 6 Hospital Puerto Cortés 08:00 a 16:00	CEDIS San Pedro Sula Salida 06:55	San Pedro Sula Llegada 17:06	109.6 km 2 h 11 min
17/11	Revisión 7 Hospital El Progreso 08:00 a 16:00	CEDIS San Pedro Sula Salida 07:24	San Pedro Sula Llegada 16:37	57.7 km 1 h 13 min

Reserva de este equipo: 18/11, 19/11 de noviembre. Cierre de informes y auditoría: 30/11 y 01/12, de 08:00 a 16:00. Las horas de salida y llegada son aproximadas; el acceso local no medido y las conexiones se confirman antes de viajar.

Mapa del equipo B3

CEDIS San Pedro Sula San Pedro Sula, Puerto Cortés y El Progreso

Revisiones	Farmacias	ALM	Recorrido terrestre	Carretera acumulada
7	5	2	202 km	5 h 04 min

Números = orden de revisión en el cronograma. Blanco = ALM aproximado; color = farmacia hospitalaria. C1 y C2 son bases, y R1 es descanso. Las líneas discontinuas son referencias viales recompuestas con tramos guardados; no se trazan conexiones aéreas o marítimas como carretera.



Cronograma del equipo B4

CEDIS San Pedro Sula Tela, La Ceiba y Roatán Parte 1 de 1

Fecha 2026	Actividad y unidad	Origen y salida	Destino al terminar	Carretera del día
09/11	Revisión 1 Hospital Tela Integrado 08:00 a 16:00	CEDIS San Pedro Sula Salida 06:20	La Ceiba Llegada 18:01	192.0 km 3 h 41 min
10/11	Revisión 2 Hospital Atlántida 08:00 a 16:00	Zona de La Ceiba Salida por confirmar	La Ceiba Llegada 16:14	9.2 km 0 h 14 min
11/11	Revisión 3 ALM REGION ATLANTIDA 08:00 a 16:00	Zona de La Ceiba Salida por confirmar	La Ceiba Llegada por confirmar	0.0 km 0 h 00 min
12/11	Conexión La Ceiba a Roatán	Terminal y salida por confirmar	Roatán Llegada por confirmar	Sin medición terrestre
13/11	Revisión 4 Hospital de Roatán 08:00 a 16:00	Hospedaje en Roatán Salida por confirmar	Coxen Hole Llegada por confirmar	0.0 km 0 h 00 min
16/11	Revisión 5 ALM REGION ISLAS DE LA BAHIA 08:00 a 16:00	Hospedaje en Roatán Salida por confirmar	Coxen Hole Llegada por confirmar	0.0 km 0 h 00 min
17/11	Conexión Roatán a La Ceiba	Terminal y salida por confirmar	La Ceiba Llegada por confirmar	Sin medición terrestre
18/11	Traslado Regreso al CEDIS de origen	Zona de La Ceiba Salida 08:00	San Pedro Sula Llegada 12:01	190.2 km 3 h 31 min


Reserva de este equipo: 19/11, 20/11 de noviembre. Cierre de informes y auditoría: 30/11 y 01/12, de 08:00 a 16:00. Las horas de salida y llegada son aproximadas; el acceso local no medido y las conexiones se confirman antes de viajar.

Mapa del equipo B4

CEDIS San Pedro Sula Tela, La Ceiba y Roatán

Revisiones	Farmacias	ALM	Recorrido terrestre	Carretera acumulada
5	3	2	391 km	7 h 26 min

Números = orden de revisión en el cronograma. Blanco = ALM aproximado; color = farmacia hospitalaria. C1 y C2 son bases, y R1 es descanso. Las líneas discontinuas son referencias viales recompuestas con tramos guardados; no se trazan conexiones aéreas o marítimas como carretera.

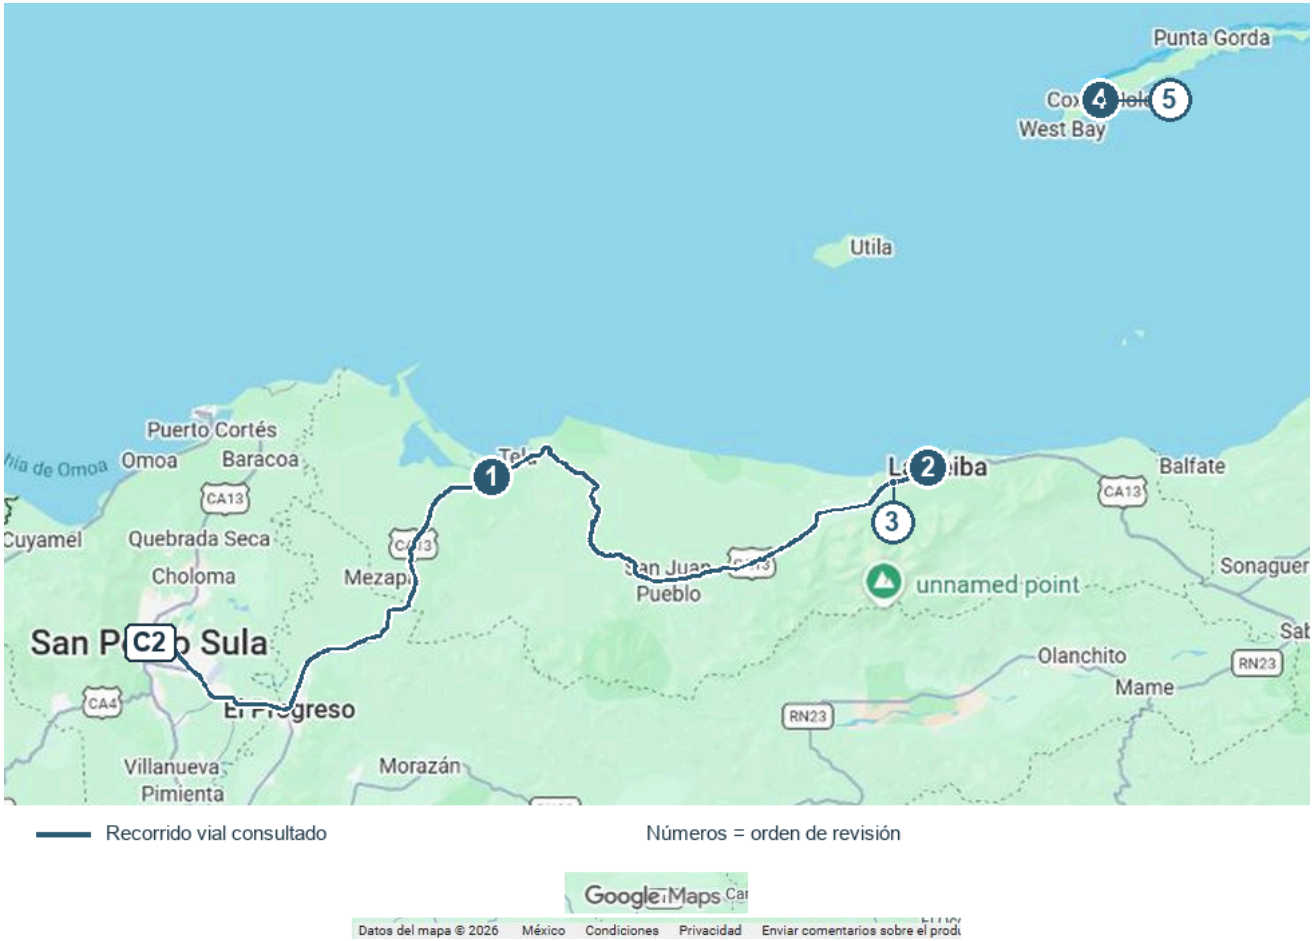

Referencias de ubicación de los ALM

Parte 1 de 2

Nombre del expediente	Localidad	Referencia utilizada	Condición
ALM REGION ATLANTIDA	La Ceiba	Region Sanitaria Departamental de Atlantida n°1	Sede sanitaria de referencia
ALM REGION CHOLUTECA	Choluteca	Region Salud Choluteca	Sede sanitaria de referencia
ALM REGION COLON	Trujillo	Región Sanitaria Departamental, Colon	Sede sanitaria de referencia
ALM REGION COMAYAGUA	Comayagua	Almacén departamental de salud comayagua	Coincidencia de nombre de almacén
ALM REGION COPAN	Santa Rosa de Copán	Almacén departamental de salud N°4 Copan	Coincidencia de nombre de almacén
ALM REGION CORTES	San Pedro Sula	Región Sanitaria Departamental de Cortés	Sede sanitaria de referencia
ALM REGION EL PARAISO	Danlí	Bodega de Medicamentos	Coincidencia de nombre de almacén
ALM REGION FRANCISCO MORAZAN	Tegucigalpa	Almacén Regional	Coincidencia de nombre de almacén
ALM REGION GRACIAS A DIOS	Puerto Lempira	Region Sanitaria No 9	Sede sanitaria de referencia
ALM REGION INTIBUCA	La Esperanza	Almacén regional de medicamentos	Coincidencia de nombre de almacén

Los dos CEDIS y Santa Rosa de Copán son referencias urbanas de planeación. Los 20 ALM tienen ubicaciones aproximadas: cinco coincidencias de nombre de almacén, trece referencias sanitarias y dos de localidad. Sus accesos se confirman antes de fijar las citas.

Los puntos de las 32 farmacias provienen del expediente previo. Ninguna referencia de ALM equivale a una confirmación institucional del acceso físico. Las coincidencias de otra región o país se descartaron.

Referencias de ubicación de los ALM

Parte 2 de 2

Nombre del expediente	Localidad	Referencia utilizada	Condición
ALM REGION ISLAS DE LA BAHIA	Roatán	Referencia de Roatán	Referencia de localidad
ALM REGION LA PAZ	La Paz	Región Sanitaria La Paz	Sede sanitaria de referencia
ALM REGION LEMPIRA	Gracias	Regulacion Sanitaria Departamento De Lempira	Sede sanitaria de referencia
ALM REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA	San Pedro Sula	Región Metropolitana de Salud San Pedro Sula	Sede sanitaria de referencia
ALM REGION METROPOLITANA DEL DISTRITO CENTRAL	Tegucigalpa	Referencia de Tegucigalpa	Referencia de localidad
ALM REGION OCOTEPEQUE	Ocotepeque	Región de Salud de Ocotepeque	Sede sanitaria de referencia
ALM REGION OLANCHO	Juticalpa	Región Sanitaria #15	Sede sanitaria de referencia
ALM REGION SANTA BARBARA	Santa Bárbara	Regional de Salud nº 16	Sede sanitaria de referencia
ALM REGION VALLE	Nacaome	Región Sanitaria Departamental, Nacaone, Valle	Sede sanitaria de referencia
ALM REGION YORO	Yoro	Region Departamental de Salud Yoro	Sede sanitaria de referencia

Los dos CEDIS y Santa Rosa de Copán son referencias urbanas de planeación. Los 20 ALM tienen ubicaciones aproximadas: cinco coincidencias de nombre de almacén, trece referencias sanitarias y dos de localidad. Sus accesos se confirman antes de fijar las citas.

Los puntos de las 32 farmacias provienen del expediente previo. Ninguna referencia de ALM equivale a una confirmación institucional del acceso físico. Las coincidencias de otra región o país se descartaron.

Preparación de visitas e información por levantar

Área	Información principal
Farmacia	Claves manejadas, CPM, dispensación, horarios, existencias, faltantes, vencimientos y continuidad del servicio.
Operación y almacenes	Espacio útil, equipos, personal por turno, recibo, inventarios, preparación, distribución y tiempos desde origen.
Regulación y calidad	Autorizaciones, responsabilidad técnica, trazabilidad, controlados, conservación, bitácoras de temperatura, calibración y desviaciones.

Los instrumentos de revisión conservan 60 preguntas: 20 de farmacia, 20 de operación y almacenes y 20 de regulación y calidad. Se aplican según la función de la instalación. El especialista disponible y el personal de SESAL priorizan los puntos pertinentes y dejan identificadas las validaciones de otra especialidad.

Responsable de la unidad	Documentación para la visita
Farmacia y responsable técnico	Catálogo por clave, CPM por periodo, unidades dispensadas, horarios, turnos, faltantes, vencimientos y reposición.
Almacén y logística	Inventario por lote y vencimiento, recibos, pedidos, distribución, ventanas de atención, tiempos desde origen y registros de diferencias.
Regencia y calidad	Autorizaciones aplicables, responsables habilitados, procedimientos, controlados, bitácoras de temperatura, desviaciones, calibración, limpieza y continuidad.

Se mantiene la propuesta de confirmar la visita con tres días hábiles de anticipación y reconfirmarla el día previo. El contacto es el responsable de farmacia o almacén. Los rangos de conservación se contrastan con las condiciones autorizadas de cada producto. La revisión se concentra en farmacia y almacenes.

Los kilómetros y las trazas proceden de consultas guardadas de Google Routes y Google Maps. Los enlaces sin geometría digital no se dibujan como una carretera inventada. El estado del camino, el acceso al inmueble y la disponibilidad de responsables se confirman antes de ejecutar.
